ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБЕКТ: Ремонт и изграждане на нови огради и съоръжения към тях в автобусно подразделение „Марашевци“

№ по ред	Наименование на СМР и КРР	марка	Количество	Норма време (ч.-ч.)	Човекo-дни	Бр. работници	Работни дни = календарни
	Подготовка на площадката				12	4	3.0
1	Окастряне на клони и почистване на	м	1870.0	0.47	109.9	4	27.5
2	Демонтаж на стара ограда и складиране на разстояние до 500м. временна ограда	м	1490.0	1.12	208.6	4	52.2
3	Направа на бетонов фундамент и нова конструкция за укрепване на тръби на парно/газ	м	1870.0	0.4	93.5	4	23.4
4	Механично почистване от корозия на участък с LТламарина	м	380.0	0.57	27.1	4	6.8
5	Двустранно грундиране и боядисване на ограда с LТламарина	м	380.0	0.60	28.5	4	7.1
6	Доставка и монтаж на кльон с бодлива тел на участък с LT ламарина	м	380.0	0.48	22.8	4	5.7
7	Доставка и монтаж на нова ограда с кльон от бодлива тел, Н=2,40м , поцинкована с PVC покритие , цвят- RAL 6005	м	1490.0	1.60	298.0	4	74.5
8	Доставка и монтаж на плъзгаща врата с автомат за отваряне, с дистанционно управление, 7.7/2 м., поцинкована с ПВЦ покритие, цвят RAL 6005, вкл. окабеляване	бр.	1.0	32.00	4.0	3	1.3
9	Доставка и монтаж на врата 1/2 м. с контрол на достъп - магнитна карта, поцинкована, с ПВЦ покритие, цвят RAL 6005, вкл. окабеляване	бр.	3.0	20.00	7.5	3	2.5
10	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова електрохидравлична автоматична бариера за натоварен график, с дистанционно управление, защитна фотоклетка, индуктивна примка и възможност за доокомплектовка според контрола на достъп, с дължина на рамото 4.5/5 м., вкл. подготовка на основата и окабеляване	бр.	1.0	24.00		3	1.0
11	Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова електрохидравлична автоматична бариера за натоварен график, с дистанционно управление, защитна фотоклетка, индуктивна примка и възможност за доокомплектовка според контрола на достъп, с дължина на рамото 6 м., вкл. подготовка на основата и окабеляване	бр.	1.0	24.00	3.0	2	1.5
12	Доставка и монтаж на двупосочен неръждаем турникет с падащо рамо и подвижна въртяща се глава, вкл. четец за магнитни карти и 700 бр. магнитни карти	бр.	1.0	24.00	3.0	2	1.5
13	Доставка и монтаж на контейнер за охрана 150/250/250 см., с климатик 9000 BTU, тристранно остъклен, с две гишета, с топлоизолация 4 см., под - ламиниран паркет, външно и вътрешно осветление, контакти, вкл. демонтаж на стар, оформяне на фундамент и електрозахранване	бр.	1.0	24.00	3.0	2	1.5
14	Доставка и монтаж на контейнер за охрана 150/250/250 см., с климатик 9000 BTU, двустранно остъклен, с едно гише, с топлоизолация 4 см., под - ламиниран паркет, външно и вътрешно осветление, контакти, вкл. демонтаж на стар, оформяне на фундамент и електрозахранване	бр.	2.0	24.00	6.0	3	2.0
	Почистване и предаване на площадката				12	4	3.0
	ОБЩО				839		

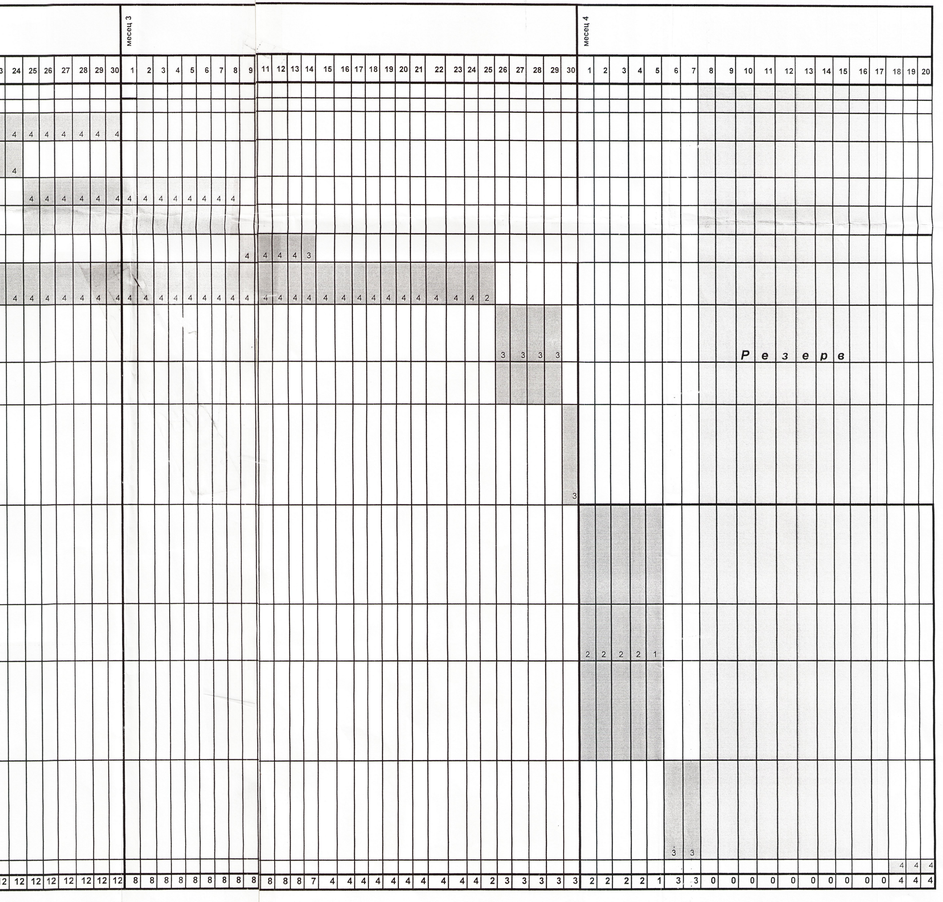

Представляващ ДЗЗД "Строителство и ремонти "

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ ДЗЗД СОФИЯ
